Documentación Scrum - Proyecto: Mini Sistema de Reservas

1. Información del equipo

1. **Nombre del Equipo:** The Best Team
2. **Product Owner (PO):** Juan José González Rosales
3. **Scrum Master (SM) / Dev:** Luis Alejandro Abreo Carrillo
4. **Desarrollador 1:** Jesús Sleyder Sánchez Acevedo
5. **Desarrollador 2:** Juan Sebastián Jaimes Rolón

2. Product Backlog (Priorizado por PO)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
HU-01	Como estudiantes, docente o personal administrativo quiero ver las salas disponibles para conocer qué espacios existen.	1	1. El sistema debe mostrar una lista de todas las salas registradas. 2. Cada sala debe mostrar al menos nombre o código. 3. La lista debe cargarse correctamente al abrir el sistema.
HU-02	Como estudiantes, docente o personal administrativo quiero consultar las reservas de un día para saber qué salas están ocupadas.	2	1. El usuario puede seleccionar una fecha. 2. El sistema muestra todas las reservas de ese día. 3. Las reservas deben ordenarse por hora de inicio.
HU-03	Como estudiantes, docente o personal administrativo quiero crear una reserva indicando sala, fecha, hora de inicio y fin para asegurar el espacio	3	1. El usuario debe poder seleccionar una sala. 2. Debe ingresar fecha, hora de inicio, hora de fin responsable. 3. La reserva se

	y evitar que otros lo ocupen al mismo tiempo.		guarda si los datos ingresados son válidos. 4. La reserva se guarda si la sala está disponible para la fecha y hora especificada. 5. Mensaje de confirmación del registro de sala. 6. Persistencia en base de datos.
HU-04	Como estudiantes, docente o personal administrativo quiero ver el detalle de una reserva para conocer toda su información.	4	1. El sistema debe mostrar sala, fecha, horario, responsable y descripción. 2. La información debe visualizarse de forma clara.
HU-05	Como estudiantes, docente o personal administrativo quiero cancelar una reserva para liberar la sala.	5	1. El usuario debe poder seleccionar una reserva existente. 2. El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar. 3. La reserva desaparece de la lista después de eliminarla. 4. Persistencia en base de datos. 5. No se puede eliminar reservas que su fecha ya haya pasado.
HU-06	Como estudiantes, docente o personal administrativo quiero modificar una reserva para cambiar horario o sala.	6	1. El usuario puede editar los datos de la reserva. 2. El sistema valida que el nuevo horario no genere conflictos. 3. Los cambios se guardan correctamente. 4. Persistencia en base de datos.

HU-07	Como usuario quiero registrar una nueva sala para ampliar la oferta de espacios.	7	1. Formulario con campos: nombre/código y descripción opcional. 2. Validar que el nombre no esté duplicado. 3. Persistencia en SQLite.
HU-08	Como usuario quiero eliminar una sala para que no aparezca más en el listado si deja de existir.	8	1. Seleccionar sala del listado. 2. Crítico: Impedir eliminación si la sala tiene reservas activas. 3. Confirmación previa.
HU-09	Como usuario quiero visualizar las reservas de una semana para planificar con antelación.	9	1. El sistema debe permitir filtrar por rango de 7 días. 2. Mostrar resumen de sala y horario. 3. Opción de navegar a la semana siguiente/anterior.
HU-10	Como usuario quiero buscar una reserva por nombre de responsable para encontrarla rápidamente.	10	1. Campo de búsqueda de texto. 2. Filtrado en tiempo real en la lista de reservas. 3. Mostrar todos los detalles al encontrar coincidencia.

3. Sprint Planning

📑 Sprint Planning: Sprint 1

🗓️ Detalles del Sprint

- 🕒 **Fecha de inicio:** 13 de marzo 2026
- 🕒 **Fecha de finalización:** 18 de marzo 2026
- ⏳ **Duración:** 5 días
- 🚩 **Prioridad:** 1, 2, 3 y 7

🎯 Sprint Goal

Objetivo: Permitir al usuario visualizar las salas disponibles, consultar las reservas en el sistema y crear una reserva de sala.

Incremento esperado: Sistema funcional que implemente un orden adecuado a las solicitudes de reservas.

Sprint Backlog:

📋 Sprint Backlog

📝 Historia	💡 Justificación
HU1 - Ver salas disponibles	Base del sistema para visualizar salas
HU2 - Consultar reserva	Base del sistema para visualizar reservas
HU3 - Crear reserva	Base del sistema para reserva de sala
HU7 - Registrar una nueva sala	Ampliar la oferta de espacios disponibles en el sistema

👥 Repartición de Tareas (Sprint 1)

🏢 HU1 – Ver salas disponibles

🛠 Tarea	👤 Responsable	🟢 Estado
Crear consulta a base de datos	Dev. (Sebastián)	To Do
Diseñar interfaz de visualización	Dev. (Sebastián)	To Do
Listado de salas registradas	Dev. (Sebastián)	To Do
Mostrar nombre o código de sala	Dev. (Sebastián)	To Do
Pruebas de carga al iniciar sistema	Dev. (Sebastián)	To Do

🏷 HU7 – Registrar una nueva sala

🛠 Tarea	👤 Responsable	🟢 Estado
Diseño del formulario	Dev. (Sebastián)	To Do
Validar que no haya otra sala existente con los mismos datos	Dev. (Sebastián)	To Do

🔍 HU2 – Consultar historial de reserva

🛠 Tarea	👤 Responsable	🟢 Estado
Crear consulta en base de datos	Dev. (Jesus)	To Do
Diseñar interfaz de visualización	Dev. (Jesus)	To Do
Crear función para obtener reservas por fecha	Dev. (Jesus)	To Do
Diseñar selector de fecha	Dev. (Jesus)	To Do
Ordenar reservas por hora de inicio	Dev. (Jesus)	To Do
Mostrar lista de reservas	Dev. (Jesus)	To Do
Mostrar información de cada reserva	Dev. (Jesus)	To Do

📅 HU3 - Crear reserva

🛠 Tarea	👤 Responsable	🟢 Estado
Diseñar formulario de reserva	Dev. (Luis)	To Do
Validación de campos obligatorios	Dev. (Luis)	To Do
Implementar lógica de verificación de disponibilidad	Dev. (Luis)	To Do
Manejar la persistencia de datos en el sistema	Dev. (Luis)	To Do
Diseñar e integrar mensaje de confirmación	Dev. (Luis)	To Do
Pruebas de flujo completo	Dev. (Luis)	To Do

4. Registro de Daily Scrum (Priorizado por el SM)

Día 1 (Arranque):

Sprint Daily - Día 1

Detalles del Sprint Daily - Día 1

- **Fecha de inicio:** 15 de marzo 2026, 8:00 PM
- **Fecha de finalización:** 15 de marzo 2026, 8:15 PM
- **Duración:** 15 Minutos
- **Equipo:** Product Owner (Juan), Scrum Master (Luis), Development Team (Sebastian)
- **Notas:** El desarrollador Andres no estuvo presente en el Sprint Daily

Evaluación del Daily

Día	Miembro	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
1	Dev. (Sebastián)	Crear consulta a base de datos, con una demo que ejemplifica el uso e implementación en el sistema	Diseñar interfaz de visualización, con el fin de obtener la base del sistema	Código no familiarizado, pero resuelto con base en la ejecución e investigación del mismo
1	SM. (Luis)	Definir las tareas para que sean ejecutadas correctamente, con una buena sintaxis	Realizar el Kanban con el fin de llevar el progreso del proyecto	Ninguno
1	PO. (Juan)	Revisión de documentación Scrum y analizando la lógica de negocio	Revisar el avance de la HU-01 ya implementada	Ninguno

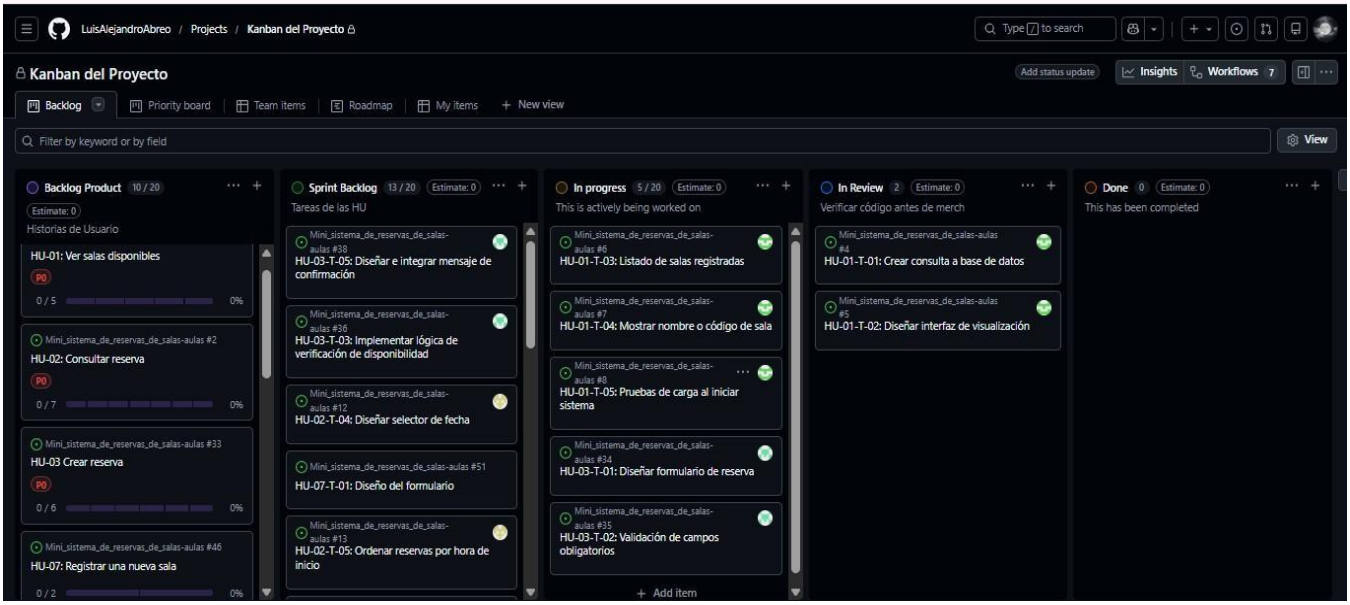

Día 2 (Seguimiento):

Sprint Daily - Día 2

Detalles del Sprint Daily - Día 2

- **Fecha de inicio:** 16 de marzo 2026, 4:00 PM
- **Fecha de finalización:** 16 de marzo 2026, 4:15 PM
- **Duración:** 15 Minutos
- **Equipo:** Product Owner (Juan), Scrum Master (Luis), Development Team (Sebastian, Jesus)
- **Notas:** Jesus se une al equipo de desarrollo

Evaluación del Daily

Día	Miembro	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
2	Dev. (Sebastián)	Resuelve todas las tareas asignadas y deja paso a la correcta implementación de las mismas	Corrección de errores y ajustes mínimos necesarios	Código redundante, solucionado y optimizado
2	SM. (Luis)	Registro de las tareas desarrolladas hasta la fecha	Visualizar el Kanban y aceptar los pull requests, con su respectiva revisión	Ninguno
2	PO. (Juan)	Mejora del manejo en los archivos, permitiendo claridad y comprensión	Consultas al Scrum Master de cómo avanza el proyecto	Ninguno

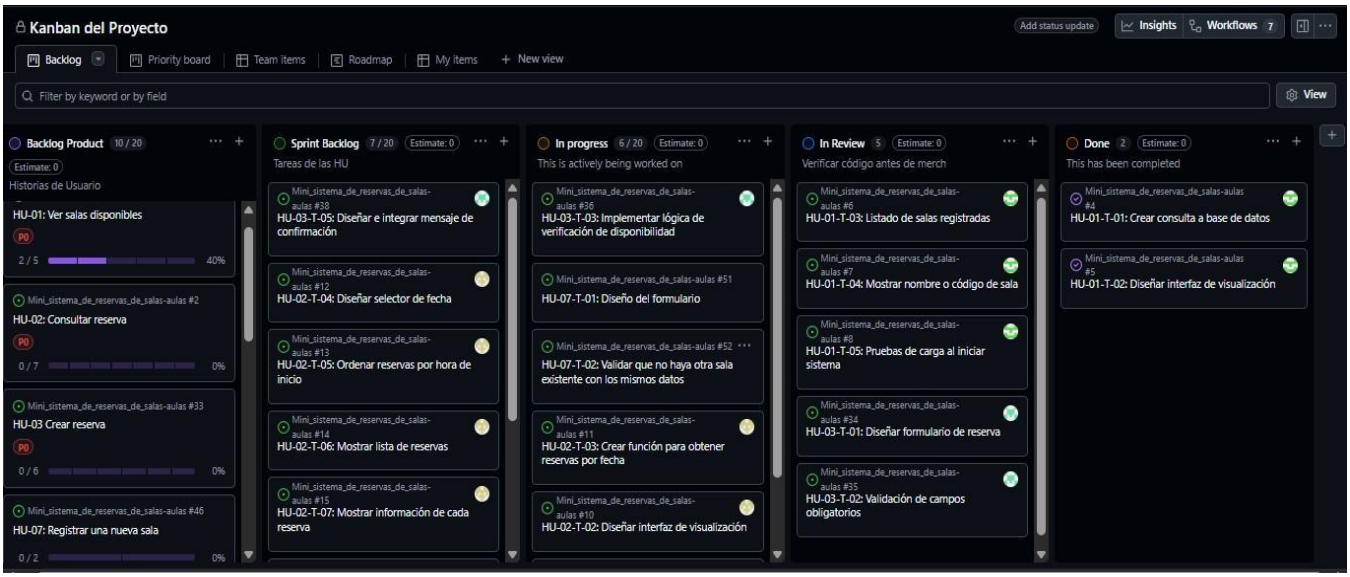

Día 3 (Seguimiento):

Sprint Daily - Día 3

Detalles del Sprint Daily - Día 3

- **Fecha de inicio:** 17 de marzo 2026, 4:45 PM
- **Fecha de finalización:** 17 de marzo 2026, 5:00 PM
- **Duración:** 15 Minutos
- **Equipo:** Product Owner (Juan), Scrum Master (Luis), Development Team (Sebastian, Jesus)
- **Notas:** El proyecto avanza hacia su punto final

Evaluación del Daily

Día	Miembro	¿Que hice ayer?	¿Que haré hoy?	Impedimentos
3	Dev. (Sebastián)	Terminar las tareas correspondientes a la HU-07 , con la correcta verificacion del codigo	Estara al tanto del avance del proyecto en el dia final	Ninguno
3	Dev. (Jesus)	Trabajar en las tareas 1,2 y 3 del HU-02	Tareas finales del HU-02 con validaciones necesarias	Inconvenientes menores
3	SM. (Luis)	Implementacion de las tareas 1, 3 y 5 del HU-03 respectivas	Terminar de revisar las tareas recaladas en revision, y los HU-03 finales	Implementacion de los requerimientos, pero resuelto con indagacion
3	PO. (Juan)	Revision del avance de los compañeros	Documentacion y revision del proyecto final en Sprint Review	Problemas familiares

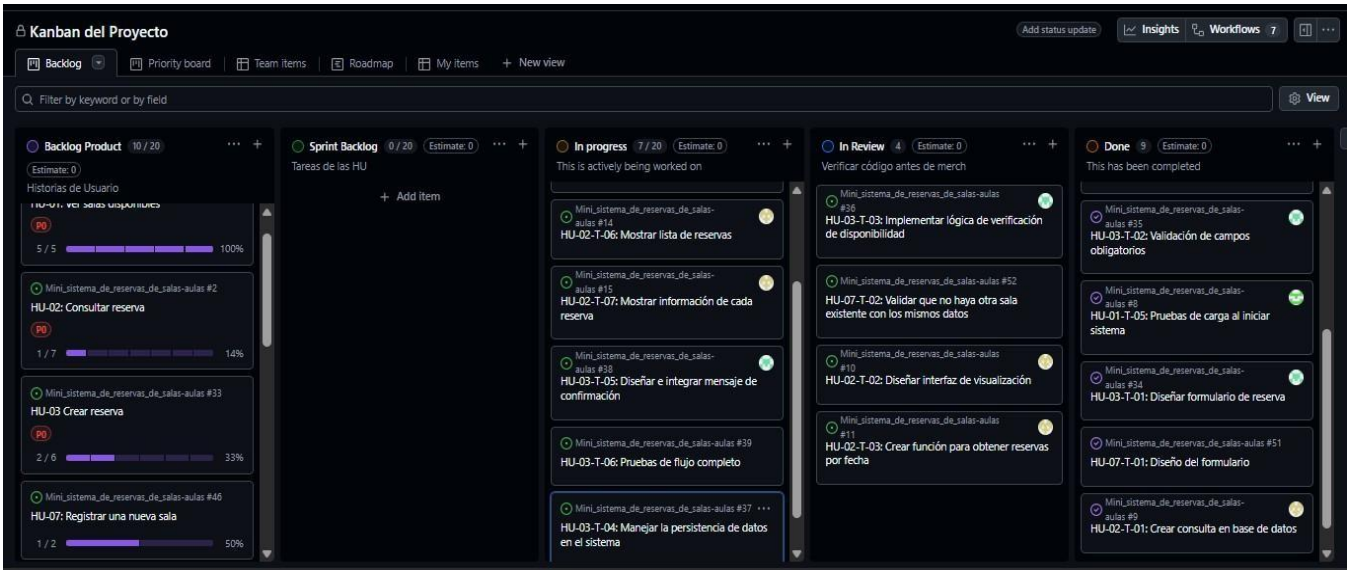

Día 4 (Cierre del Sprint):

Sprint Daily - Día 4

Detalles del Sprint Daily - Día 4

- **Fecha de inicio:** 18 de marzo 2026, 2:15 PM
- **Fecha de finalización:** 18 de marzo 2026, 2:30 PM
- **Duración:** 15 Minutos
- **Equipo:** Product Owner (Juan), Scrum Master (Luis), Development Team (Sebastian, Jesus)
- **Notas:** El proyecto esta listo para presentar a los stakeholders

Evaluación del Daily

Día	Miembro	¿Que hice ayer?	¿Que haré hoy?	Impedimentos
4	Dev. (Sebastián)	Verifica todo el sistema	Apoya la causa en pro de la eficiencia del programa	Ninguno
4	Dev. (Jesus)	Termina todas las tareas restantes del HU-02	Verificar el funcionamiento de sus funciones	Corrige errores menores para ajustarlos correctamente
4	SM. (Luis)	Termina todas las tareas restantes del HU-03	Terminar de revisar todas las tareas pendientes en In Review y comanda el Sprint Retrospective	Malentendido con algunas ramas pero resuelto con prioridad absoluta
4	PO. (Juan)	Prgeuntas oportunas al equipo	Revision de Sprint Review y Retrospective	Ninguno

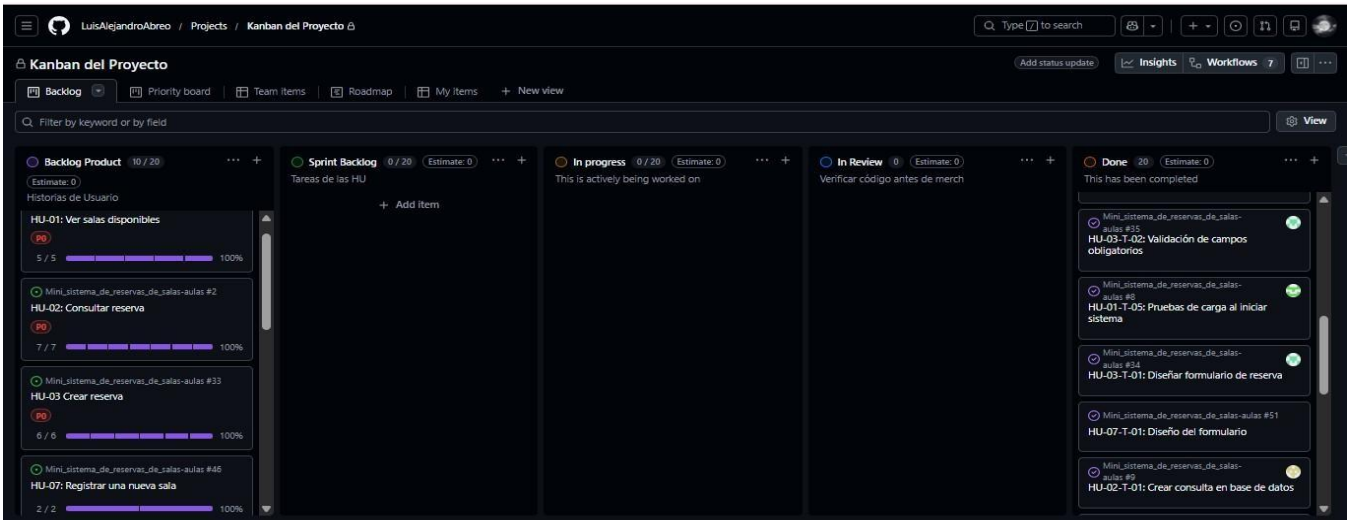

🛠️ Scrum Table Progress

👨‍💻 DEV	📝 To Do	🚧 In Progress	🔍 In Review	✅ Done
Sebastian	✓	✓	✓	Crear consulta a base de dato
Sebastian	✓	✓	✓	Diseñar interfaz de visualización
Sebastian	✓	✓	✓	Listado de salas registradas
Sebastian	✓	✓	✓	Mostrar nombre o código de sala
Sebastian	✓	✓	✓	Pruebas de carga al iniciar sistema
Sebastian	✓	✓	✓	Diseño del formulario
Sebastian	✓	✓	✓	Validar que no haya otra
Jesus	✓	✓	✓	Crear consulta a base de dato
Jesus	✓	✓	✓	Diseñar interfaz de visualización
Jesus	✓	✓	✓	Crear funcion para obtener reservas por fecha
Jesus	✓	✓	✓	Diseñar selector de fecha
Jesus	✓	✓	✓	Ordenar reservas por hora de inicio
Jesus	✓	✓	✓	Mostrar lista de reservas
Jesus	✓	✓	✓	Mostrar informacion de cada reserva
Luis	✓	✓	✓	Diseñar formulario de reserva
Luis	✓	✓	✓	Validación de campos obligatorios
Luis	✓	✓	✓	Implementar lógica de verificación de disponibilidad
Luis	✓	✓	✓	Manejar la persistencia de datos en el sistema
Luis	✓	✓	✓	Pruebas de flujo completo
Luis	✓	✓	✓	Pruebas de flujo completo

5. Sprint Review (Revisión)

Se logró terminar al 100%de las cuatro historias de usuario.

1. **Loque logramos entregar (Terminado y funcional):**
   - El listado de salas se ve correctamente en pantalla
   - Se muestra el estado (ocupado o disponible) en el que se encuentra una sala en el momento de consulta
   - Se pueden agregar nuevas salas.
   - El formulario de creación de salas valida que no exista ya una sala con las mismas características.
   - Es posible visualizar las reservas existentes por sala y fecha específica.
   - Las nuevas reservas se guardan correctamente en la base de datos y se muestran cuando se despliega el programa (persistencia de datos).
   - El formulario guarda la reserva validando que no existan cruces.

6. Sprint Restrospective (Mejora continua)

📋 Sprint Retrospective: Sistema Reserva de Aulas

Dato	Detalle
Sprint	#1
Fecha	2026-03-18
Scrum Master	Luis Abreo
Participantes	(DEV.) Jesús Sanchez, (DEV.) Sebastian Rolon, (PO.) Juan Rosales
Estado del Sprint	🟢 Completado

---

1. 🎯 Objetivo de la Sesión

Analizamos el desempeño del equipo durante el último Sprint para identificar qué procesos, herramientas o interacciones deben mantenerse, eliminarse o evolucionar, respecto al sistema de reservas de salas que hemos implementado.

2. 📊 Resumen de Ejecución

- **Historias de Usuario:** [HU-01, HU-02, HU-03, HU-04]
- **Cumplimiento de historias:** Completadas
- **Incidencias Humanas:** El Developtment Team sufrio un cambio de personal a mitad del proceso, debido a la ausencia de uno de los developers
- **Incidencias Técnicas:** El sistema no pudo compilarse en Linux debido a incongruencia de versiones

3. 🧠 Dinámica de Reflexión

- ✅ **¿Qué salió bien?**
  - El diseño inicial de la interfaz facilito la creacion de las otras funciones.
  - El acoplamiento del nuevo miembro en el Dia 2 del Sprint fue oportuno
  - La comunicacion y el trabajo en equipo entre los miembros fue efectiva
- ❌ **¿Qué no salió tan bien?**
  - Ausencia inesperada de un desarrollador
- 🚀 **¿Qué podemos mejorar?**
  - Implementar GitFlow
- 💡 **¿Qué aprendimos?**
  - Trabajo en equipo con comunicacion asertiva y escucha activa para poder desarrollar un desarrollo de software colaborativo
